

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Infraestructura

Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes


Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes


Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
[-] Central	52.526,1	74.707,7	15.636,1	20,9 %	59.071,6		21.490,1	37.581,5
[+] Carreteras Federales	0,0	14.201,7	5.284,4	37,2 %	8.917,4		7.987,9	929,4
[+] Caminos Rurales y Alimentadores	0,0	8.273,7	2.364,1	28,6 %	5.909,6		1.867,8	4.041,7
[+] Caminos Artesanales	3.120,9	6.000,0	626,2	10,4 %	5.373,8		701,6	4.672,2
[+] Conservación	27.720,3	23.232,6	6.520,5	28,1 %	16.712,1		10.533,0	6.179,1
[+] PPS´s	0,1	664,8	664,8	100,0 %	0,0		0,0	
[+] Servicios Técnicos	1,8	503,9	131,1	26,0 %	372,8		326,9	45,9
[+] Desarrollo Carretero	0,4	0,3	0,0		0,3		0,0	0,3
[+] Provisiones	21.432,0	21.432,0	0,0		21.432,0		0,0	21.432,0
[+] Infraestructura Educativa y Cultural	0,0	202,4	9,7	4,8 %	192,7		29,2	163,5
[+] Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250,6	196,3	35,3	18,0 %	161,0		43,6	117,3
[-] Coordinado	92.564,4	91.525,1	21.717,3	23,7 %	69.807,8		6.734,4	63.073,4
[+] ATTRAPI (ARTF)	45.337,6	55.414,6	21.593,6	39,0 %	33.821,0		6.703,5	27.117,6
[+] Provisiones para trenes	47.064,0	35.745,2	0,0		35.745,2		0,0	35.745,2
[+] Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162,8	365,2	123,7	33,9 %	241,6		30,9	210,7
Total	145.090,5	166.232,7	37.353,3	22,5 %	128.879,4		28.224,5	100.654,9

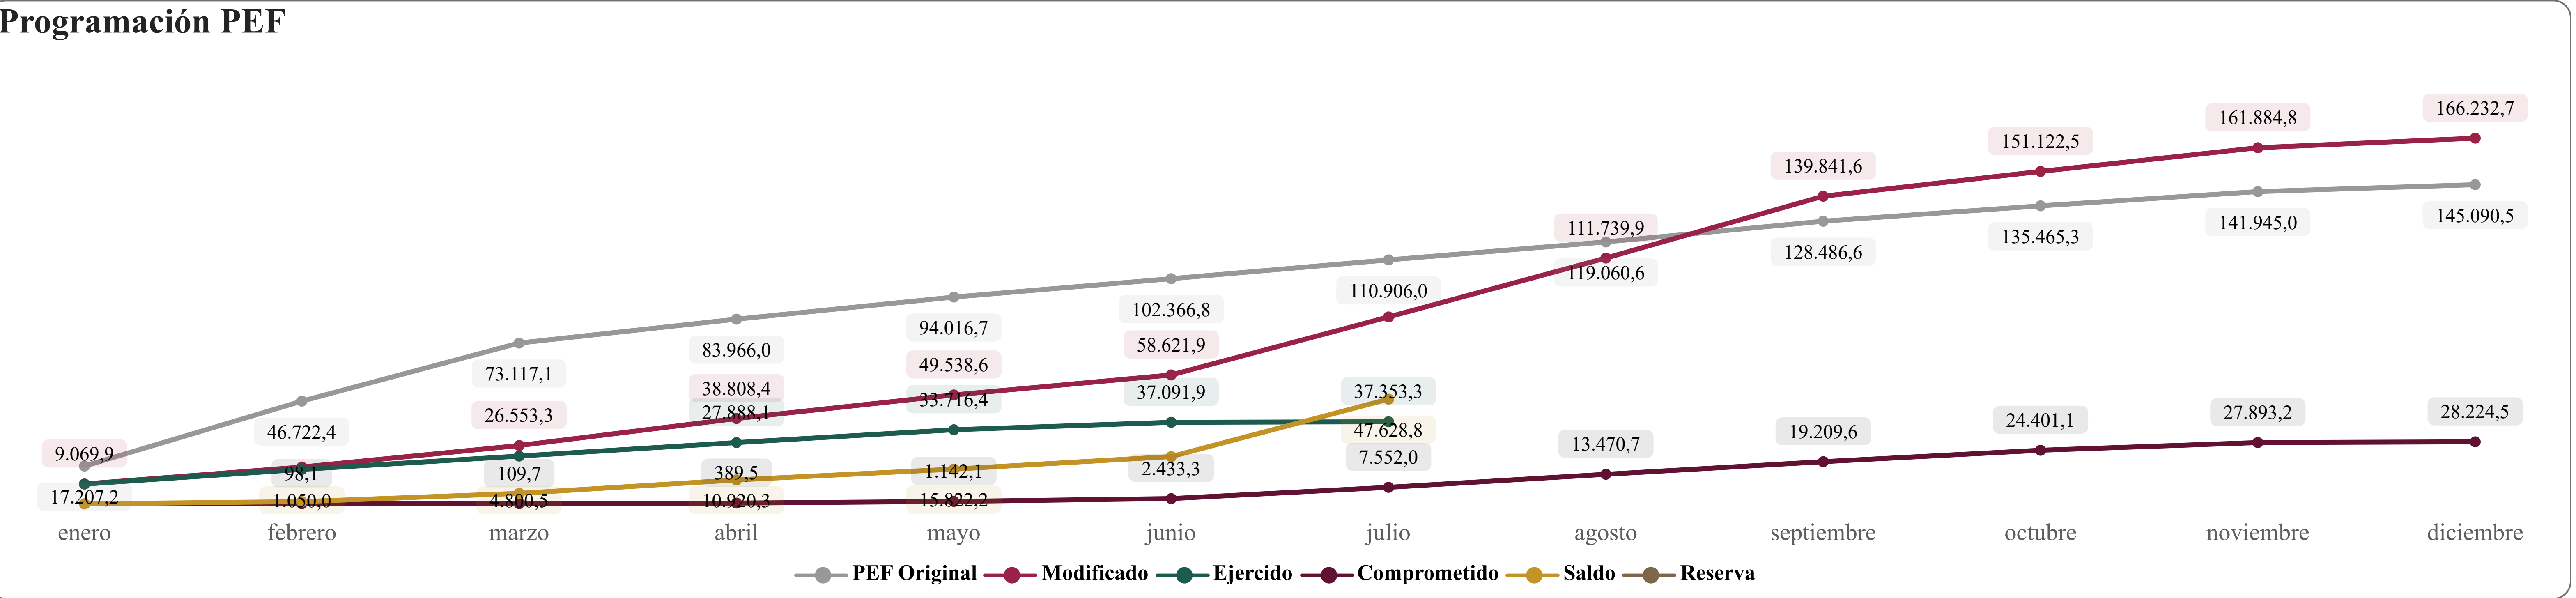



Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 30 de jun	Ejercido al cierre del 09 de jul	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Caminos Rurales y Alimentadores	2.345,05	2.364,1	19,0	5.909,6
Carreteras Federales	5.047,88	5.284,4	236,5	8.917,4
Desarrollo Carretero	0,00	0,0	0,0	0,3
Servicios Técnicos	127,02	131,1	4,1	372,8
ATTRAPI (ARTF)	21.408,15	21.593,6	185,4	33.821,0
Caminos Artesanales	588,22	626,2	38,0	5.373,8
Conservación	6.214,32	6.520,5	306,2	16.712,1
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	35,14	35,3	0,1	161,0
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	118,52	123,7	5,2	241,6
Infraestructura Educativa y Cultural	9,70	9,7	0,0	192,7
PPS´s	664,81	664,8	0,0	0,0
Provisiones	0,00	0,0	0,0	21.432,0
Provisiones para trenes	0,00	0,0	0,0	35.745,2
Total	36.558,80	37.353,3	794,5	128.879,4

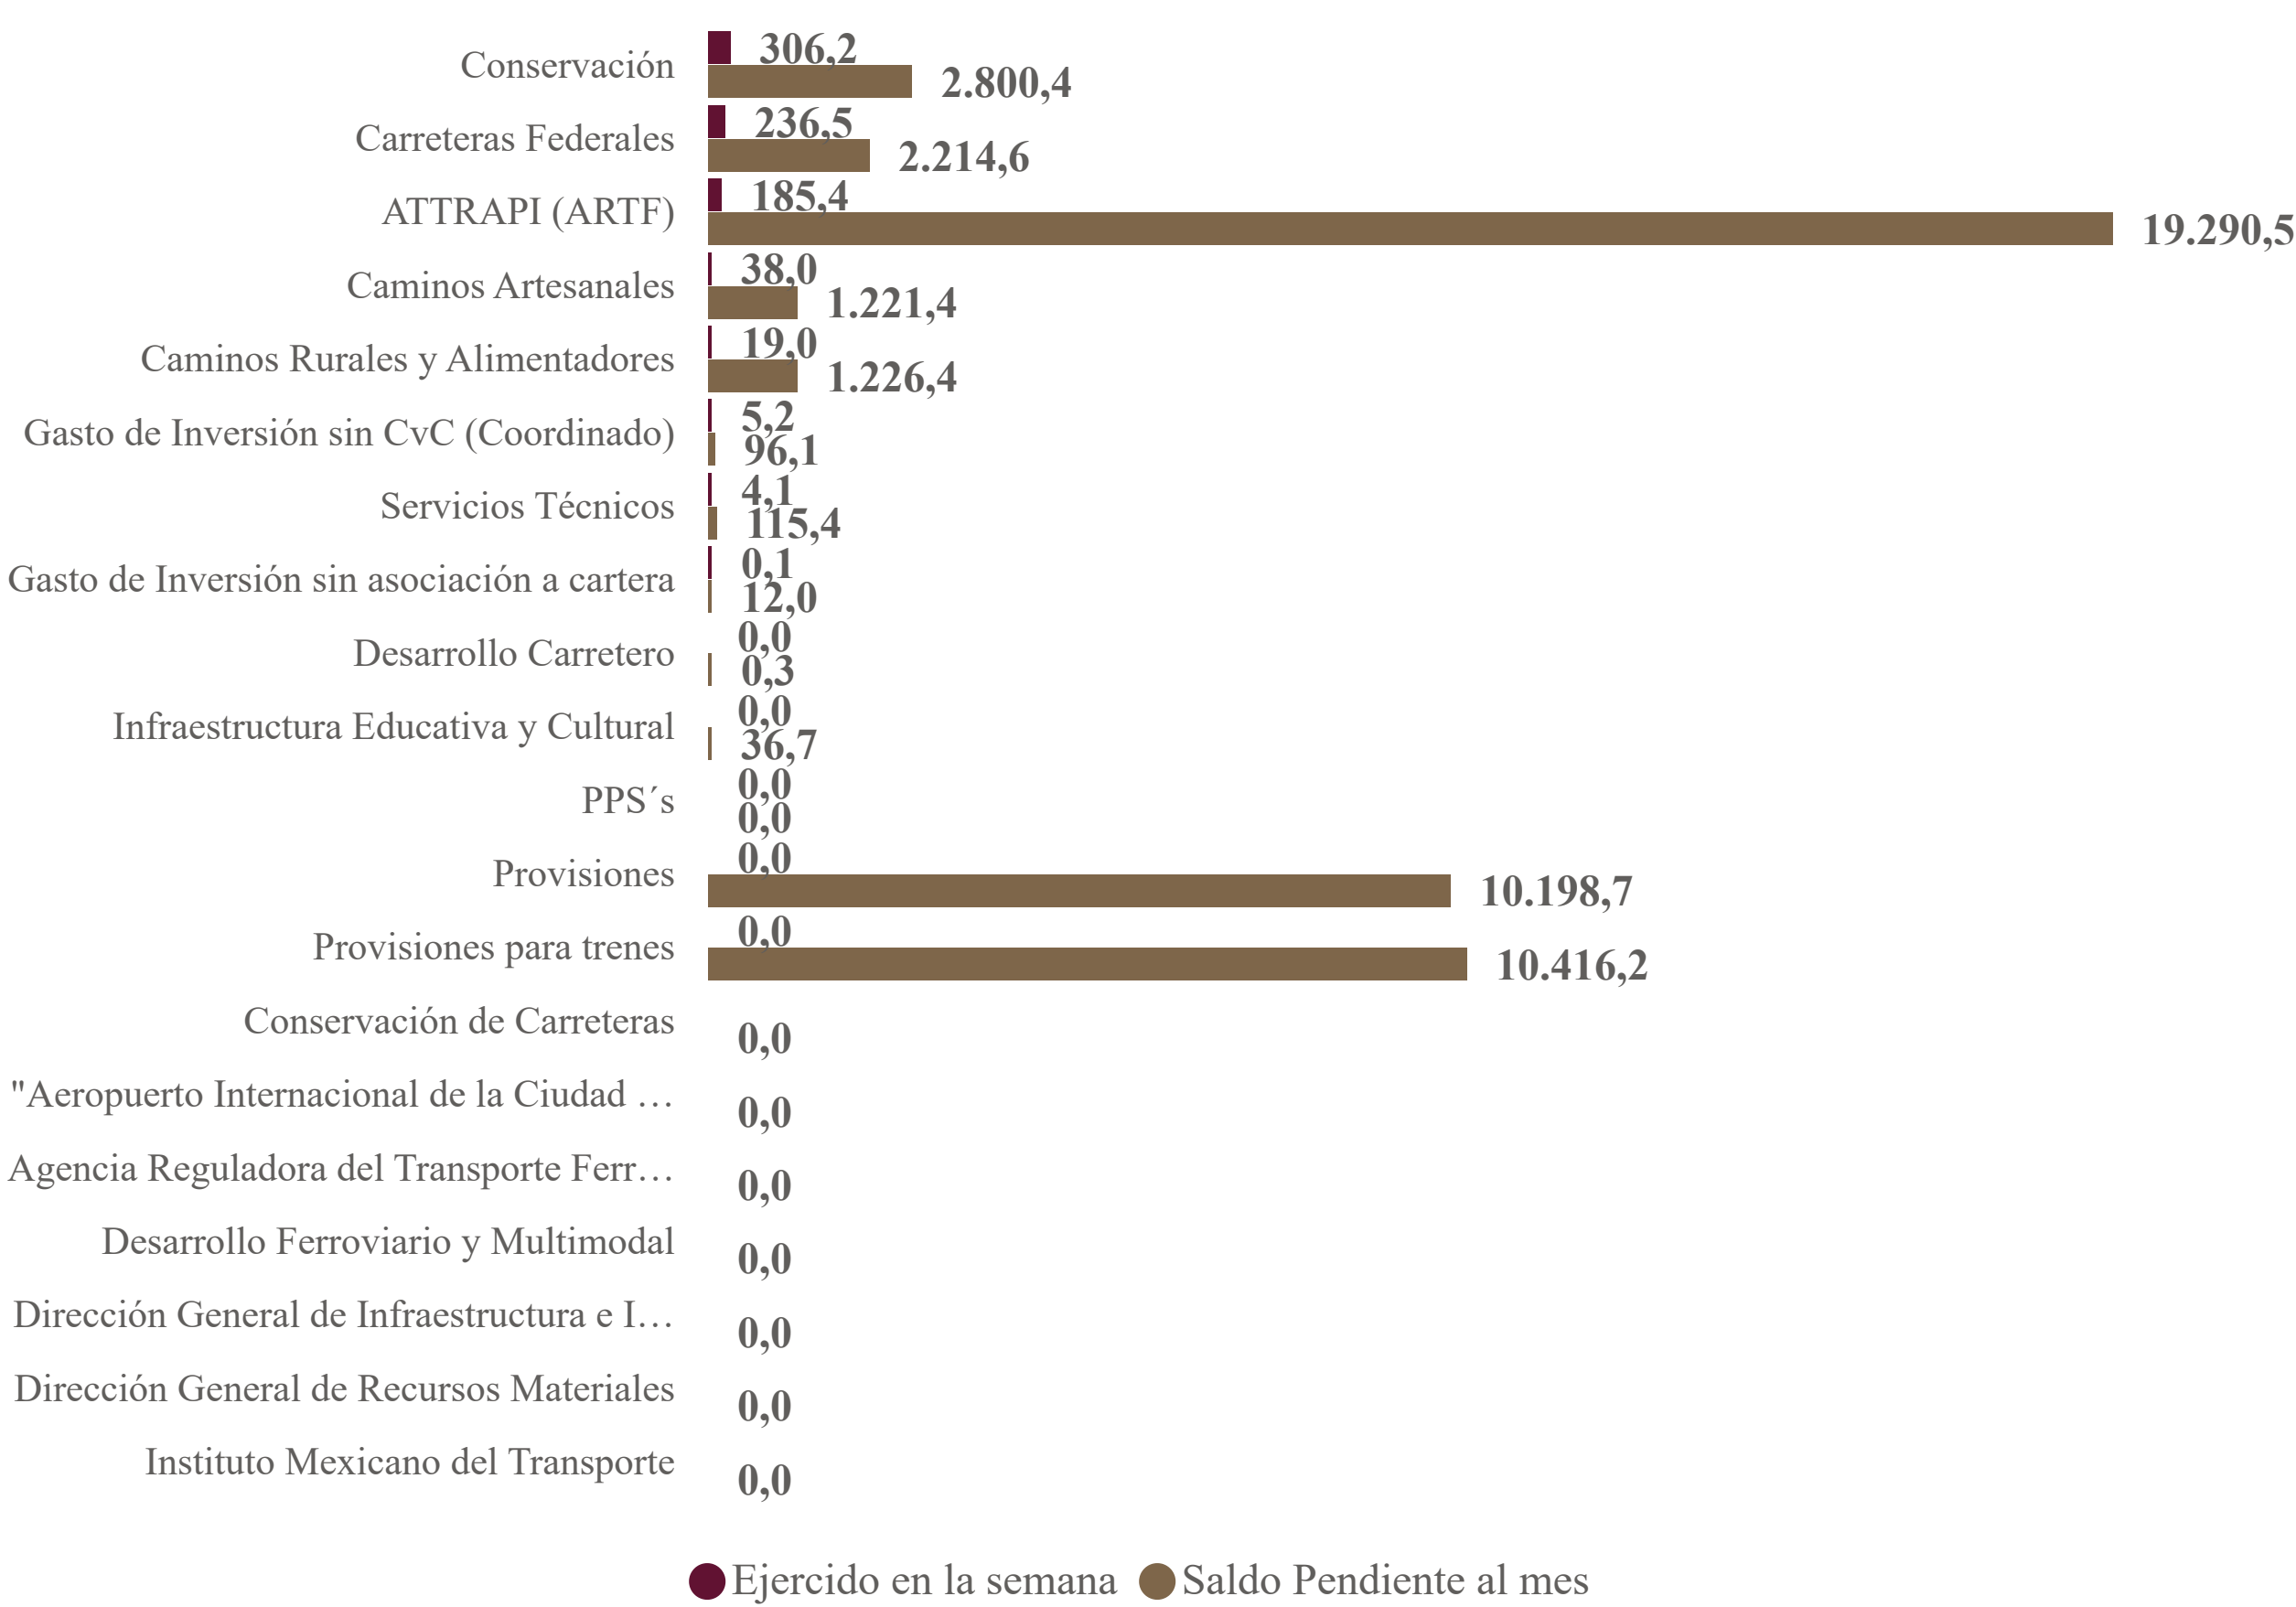

Histórico de ejercido



Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 166.232,7

Ejercido — 37.353,3

Saldo 128.879,4 77,5 %

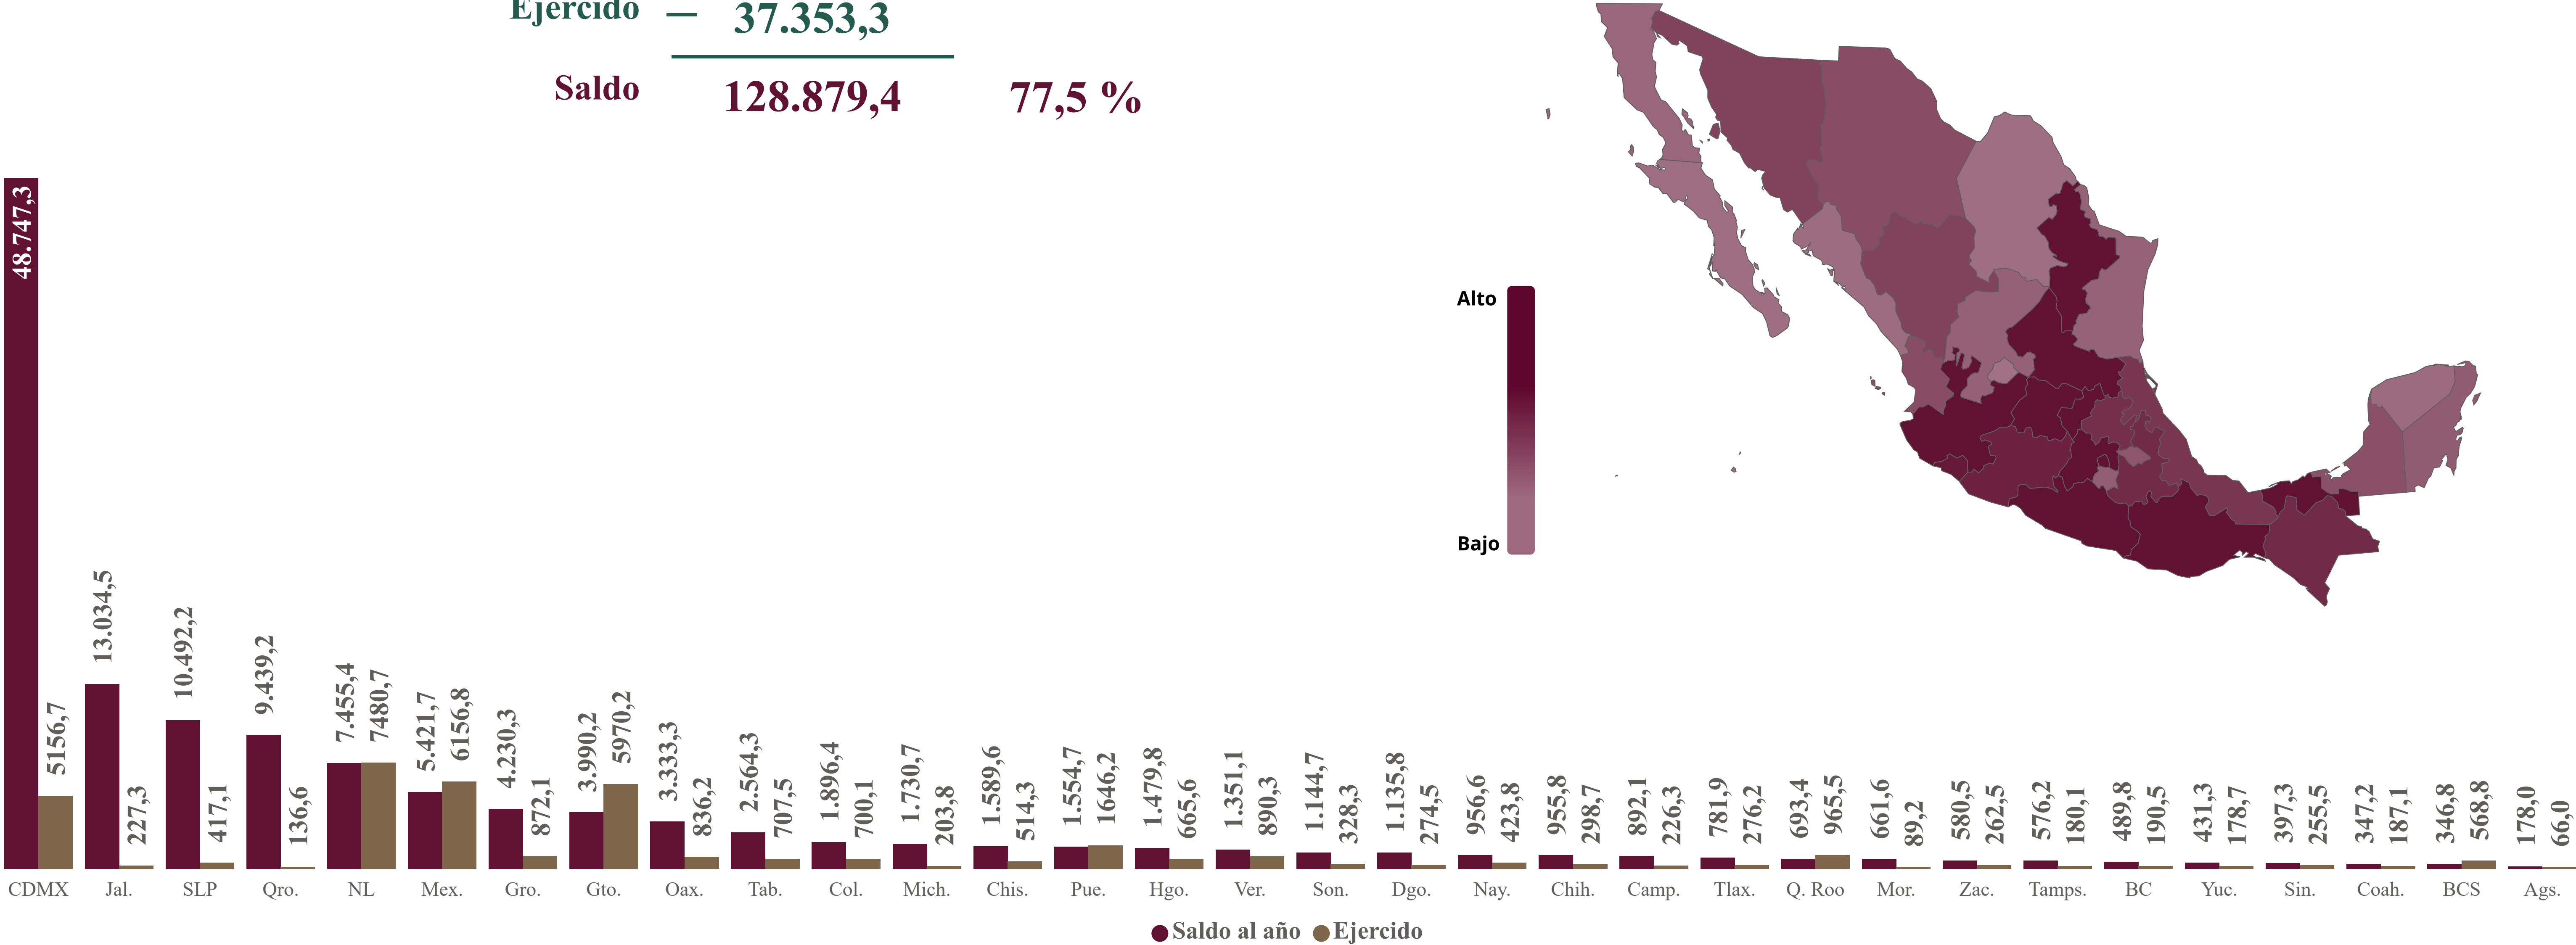



Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
9 de julio	633	K016	20096330001	Cerro Colorado - Zacualtipán	9,3
9 de julio	JZO	K019	24093110005	Estudios de Preinversión para el tren AIFA - Pachuca	31,9
30 de junio	C00	E019	2509C000012	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina en oficinas centrales SENEAM	1,5
30 de junio	C00	E019	2609C000001	Adquisición de mobiliario y equipo especializado en la Jefatura Regional Acapulco SENEAM	0,1
30 de junio	649	K008	26092170004	Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIT), campus Tlaxcala, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala	150,0
30 de junio	C00	E019	2509C000003	Equipamiento de protección civil SENEAM	3,5
25 de junio	635	K016	26096350007	Construcción del Puente Vehicular para un Par Vial en la Av. 5 de Mayo	40,1
25 de junio	217	K008	25092170020	Elaboración de Anteproyectos y Fichas Técnicas para Planteles de Educación Media Superior y Superior	10,4
25 de junio	JZO	K019	24093110007	Estudios de preinversión para el Sistema Férreo México - Nogales	21,8
25 de junio	631	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	3,9
25 de junio	642	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0,9
25 de junio	217	K008	20482000003	Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	29,2
25 de junio	641	K008	25092170018	Rehabilitación del preescolar comunitario rural Tempexquixtle Amarillo	3,1
25 de junio	JZO	K019	2609JZO0001	Sistema Ferroviario para conectar Querétaro-Saltillo	1.077,7
