



Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes



Subsecretaría de Infraestructura



Subsecretaría de Comunicaciones y
Transportes



Agencia de Trenes y Transporte Público
Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes

Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
Central	52,526.1	54,097.8	7,644.6	14.1 %	46,453.3		14,109.5	32,343.7
Carreteras Federales	0.0	11,719.4	2,464.0	21.0 %	9,255.4		7,341.8	1,913.6
Caminos Rurales y Alimentadores	0.0	4,588.2	1,604.7	35.0 %	2,983.5		1,014.0	1,969.4
Caminos Artesanales	3,120.9	1,827.4	125.2	6.8 %	1,702.3		336.7	1,365.6
Conservación	27,720.3	13,063.7	2,724.4	20.9 %	10,339.2		4,961.0	5,378.2
PPS´s	0.1	730.8	664.8	91.0 %	66.0		48.8	17.2
Servicios Técnicos	1.8	550.0	34.8	6.3 %	515.2		404.7	110.5
Desarrollo Carretero	0.4		0.0				0.0	
Provisiones	21,432.0	21,432.0	0.0		21,432.0		0.0	21,432.0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250.6	186.3	26.6	14.3 %	159.7		2.6	157.2
Coordinado	92,564.4	91,710.3	10,271.5	11.2 %	81,438.8		307.5	81,131.2
ATTRAPI (ARTF)	45,337.6	45,337.6	10,250.7	22.6 %	35,086.9		290.0	34,796.9
Provisiones para trenes	47,064.0	46,024.0	0.0		46,024.0		0.0	46,024.0
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162.8	348.7	20.8	6.0 %	327.9		17.5	310.3
Total	145,090.5	145,808.1	17,916.1	12.3 %	127,892.0		14,417.1	113,474.9

Programación PEF

Mes	PEF Original	Modificado	Ejercido	Comprometido	Saldo	Reserva
enero	16,235.0	16,235.0	17,207.2	17,207.2	6,303.7	17,207.2
febrero	45,518.8	45,518.8	46,722.4	46,722.4	8,673.8	46,722.4
marzo	72,099.9	72,099.9	73,117.1	73,117.1	58,151.6	73,117.1
abril	84,357.4	84,357.4	83,966.0	83,966.0	66,441.3	83,966.0
mayo	94,226.5	94,226.5	94,016.7	94,016.7	3,490.6	94,016.7
junio	102,399.2	102,399.2	102,366.8	102,366.8	4,839.6	102,366.8
julio	110,929.8	110,929.8	110,906.0	110,906.0	6,858.6	110,906.0
agosto	119,195.8	119,195.8	119,060.6	119,060.6	8,967.8	119,060.6
septiembre	128,743.2	128,743.2	128,486.6	128,486.6	11,728.3	128,486.6
octubre	135,866.9	135,866.9	135,465.3	135,465.3	13,356.5	135,465.3
noviembre	142,492.2	142,492.2	141,945.0	141,945.0	14,416.6	141,945.0
diciembre	145,808.1	145,808.1	145,090.5	145,090.5	14,417.1	145,090.5




Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 23 de abr	Ejercido al cierre del 30 de abr	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Conservación	1,845.50	2,724.4	878.9	10,339.2
ATTRAPI (ARTF)	9,443.66	10,250.7	807.1	35,086.9
Carreteras Federales	2,092.63	2,464.0	371.4	9,255.4
Caminos Rurales y Alimentadores	1,497.22	1,604.7	107.5	2,983.5
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	13.27	26.6	13.3	159.7
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	15.93	20.8	4.9	327.9
Servicios Técnicos	30.66	34.8	4.1	515.2
Caminos Artesanales	121.15	125.2	4.0	1,702.3
Desarrollo Carretero	0.00	0.0	0.0	
PPS's	664.81	664.8	0.0	66.0
Provisiones	0.00	0.0	0.0	21,432.0
Provisiones para trenes	0.00	0.0	0.0	46,024.0
Total	15,724.83	17,916.1	2,191.3	127,892.0



Histórico de ejercido

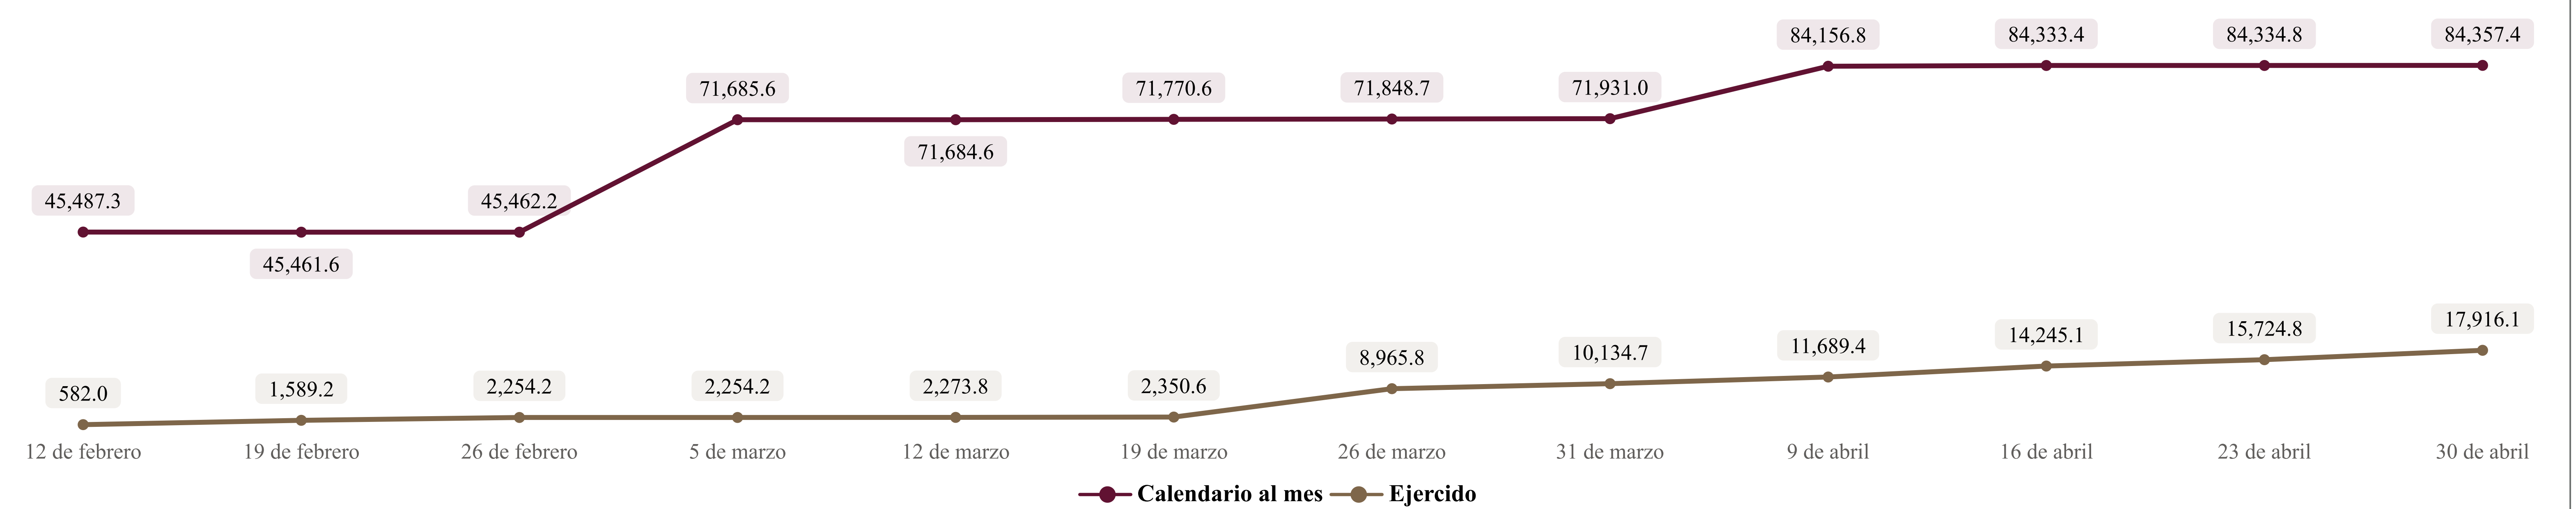

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 145,808.1

Ejercido — 17,916.1

Saldo 127,892.0 87.7 %

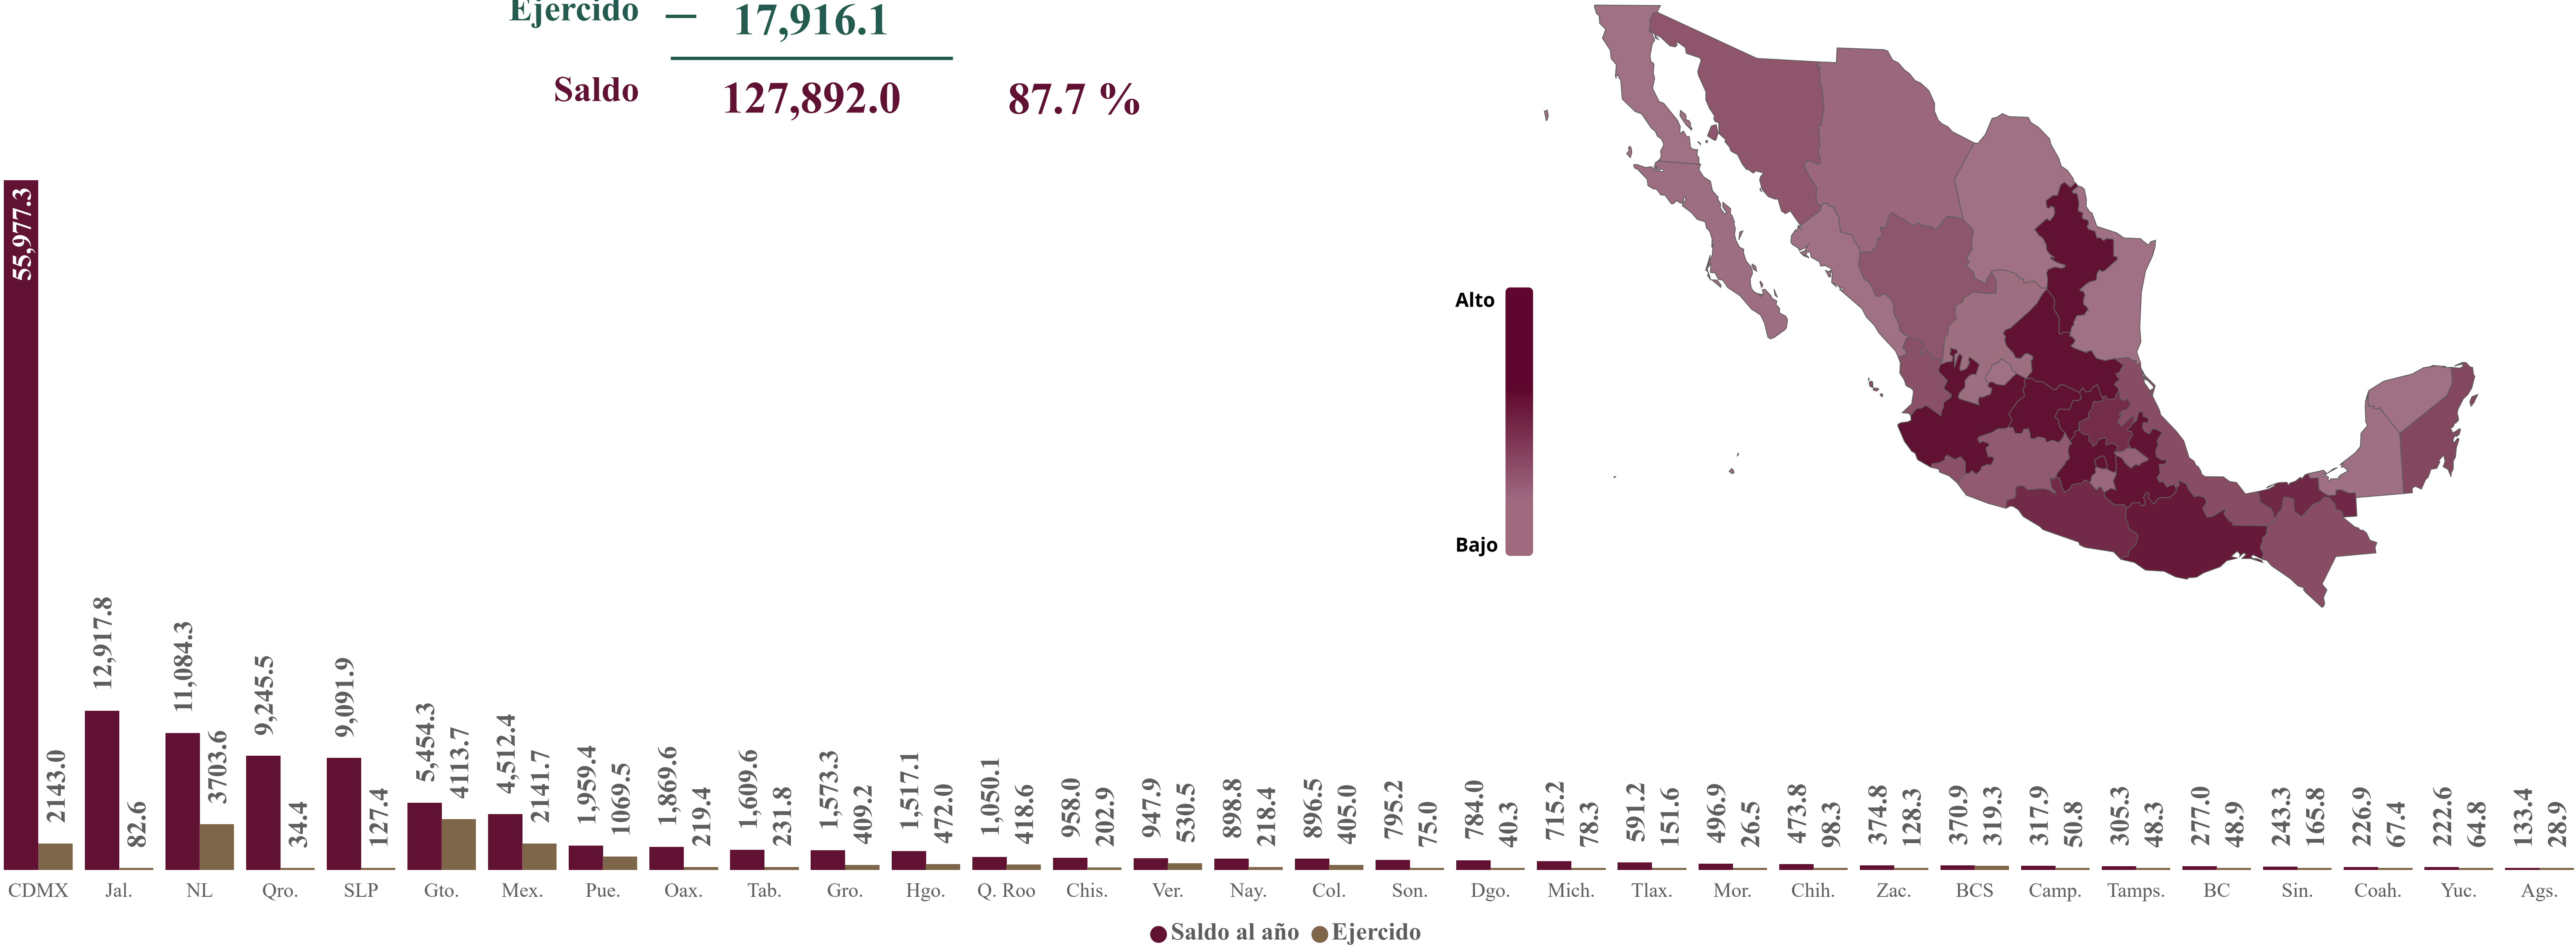



Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
30 de abril	642	K008	25092170007	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel El Marqués, Querétaro	0.0
23 de abril	646	K016	23096460001	Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son. /Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 21+400.	40.0
23 de abril	623	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	622	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	636	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	22.0
9 de abril	645	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	647	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.7
26 de marzo	627	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	36.0
26 de marzo	632	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	175.0
26 de marzo	633	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	407.5
26 de marzo	640	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	68.1
26 de marzo	641	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	184.1
26 de marzo	642	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	15.5
26 de marzo	644	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	23.9
26 de marzo	650	N003	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	299.1
