

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Infraestructura

Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes


Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año

Mes


Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
Central	52,526.1	72,688.9	9,306.6	12.8 %	63,382.3		13,895.1	49,487.2
Carreteras Federales	0.0	13,398.4	3,060.2	22.8 %	10,338.2		6,818.2	3,519.9
Caminos Rurales y Alimentadores	0.0	7,410.6	1,810.4	24.4 %	5,600.2		1,444.7	4,155.6
Caminos Artesanales	3,120.9	5,999.5	175.5	2.9 %	5,824.0		333.9	5,490.1
Conservación	27,720.3	22,992.3	3,494.4	15.2 %	19,497.9		4,866.3	14,631.6
PPS´s	0.1	713.6	664.8	93.2 %	48.8		48.8	
Servicios Técnicos	1.8	550.0	72.8	13.2 %	477.2		382.7	94.5
Desarrollo Carretero	0.4		0.0				0.0	
Provisiones	21,432.0	21,432.0	0.0		21,432.0		0.0	21,432.0
Infraestructura Educativa y Cultural	0.0	9.7	0.0		9.7		0.0	9.7
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250.6	182.8	28.6	15.6 %	154.2		0.4	153.8
Coordinado	92,564.4	91,712.1	13,616.0	14.8 %	78,096.2		527.1	77,569.0
ATTRAPI (ARTF)	45,337.6	46,001.6	13,525.5	29.4 %	32,476.1		509.0	31,967.0
Provisiones para trenes	47,064.0	45,360.0	0.0		45,360.0		0.0	45,360.0
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162.8	350.5	90.4	25.8 %	260.1		18.1	242.0
Total	145,090.5	164,401.0	22,922.5	13.9 %	141,478.4		14,422.2	127,056.2

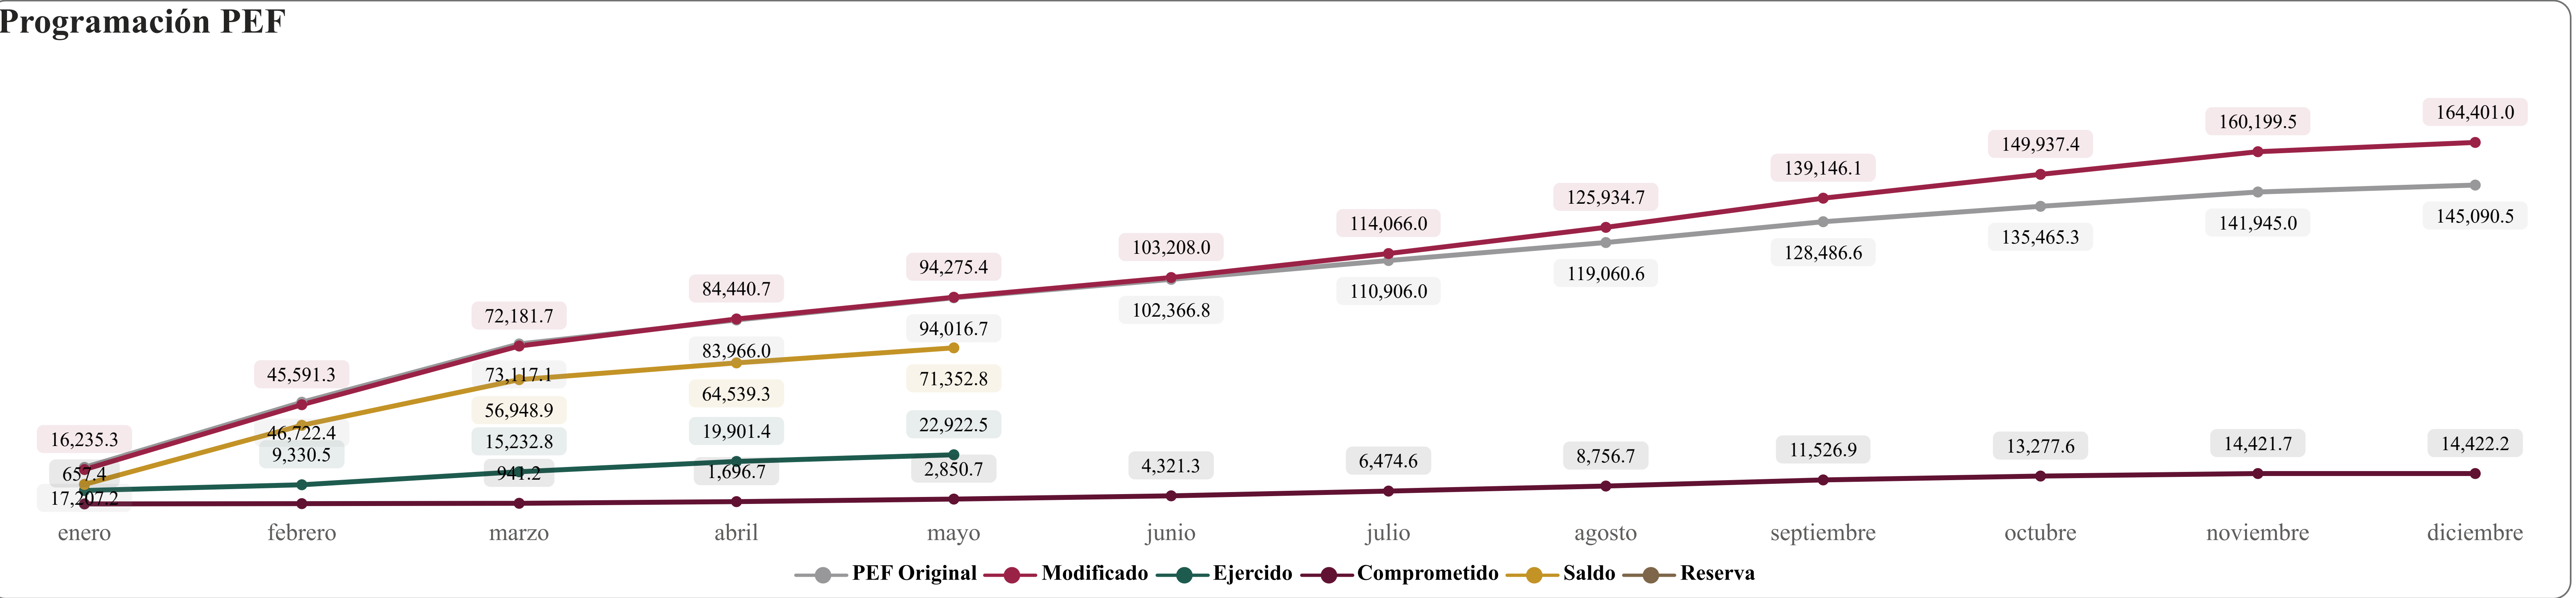




Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 07 de may	Ejercido al cierre del 14 de may	Ejercido entre periodos	Saldo al año
ATTRAPI (ARTF)	10,494.89	13,525.5	3,030.7	32,476.1
Carreteras Federales	2,477.32	3,060.2	582.9	10,338.2
Conservación	3,169.52	3,494.4	324.8	19,497.9
Caminos Rurales y Alimentadores	1,716.74	1,810.4	93.6	5,600.2
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	23.97	90.4	66.4	260.1
Caminos Artesanales	135.35	175.5	40.1	5,824.0
Servicios Técnicos	34.83	72.8	38.0	477.2
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	26.61	28.6	2.0	154.2
Desarrollo Carretero	0.00	0.0	0.0	
Infraestructura Educativa y Cultural	0.00	0.0	0.0	9.7
PPS´s	664.81	664.8	0.0	48.8
Provisiones	0.00	0.0	0.0	21,432.0
Provisiones para trenes	0.00	0.0	0.0	45,360.0
Total	18,744.03	22,922.5	4,178.5	141,478.4

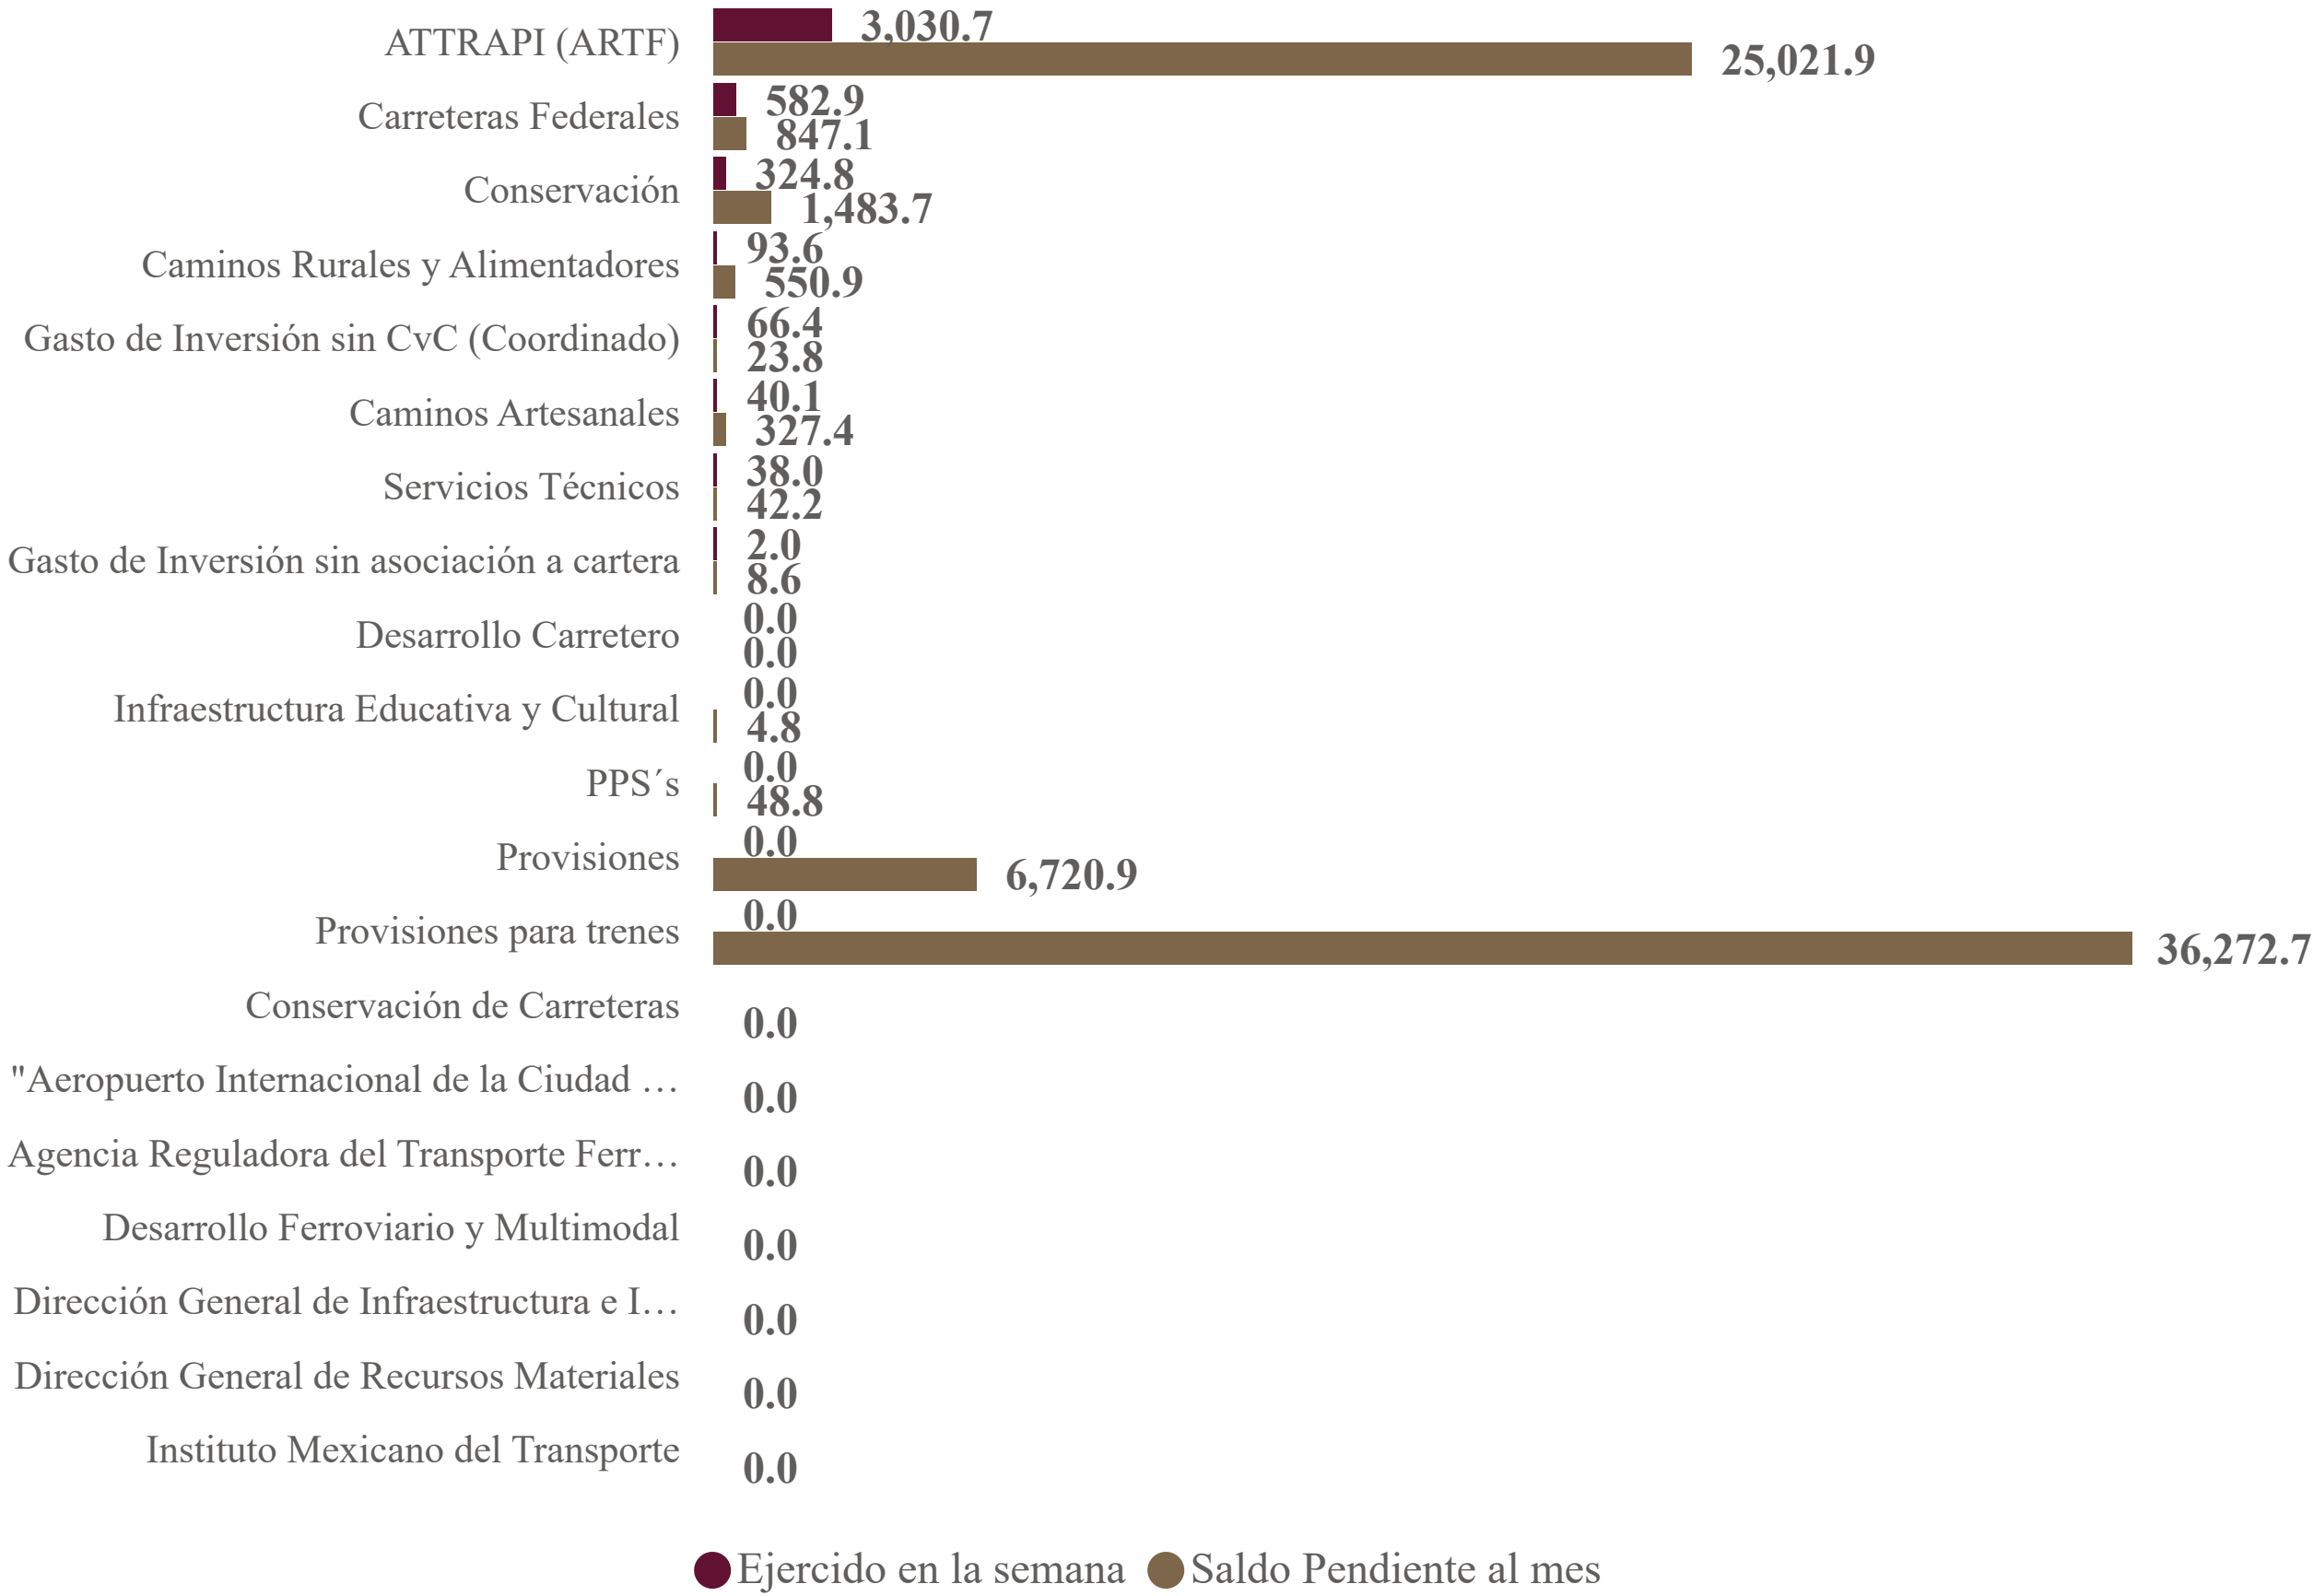

Histórico de ejercido

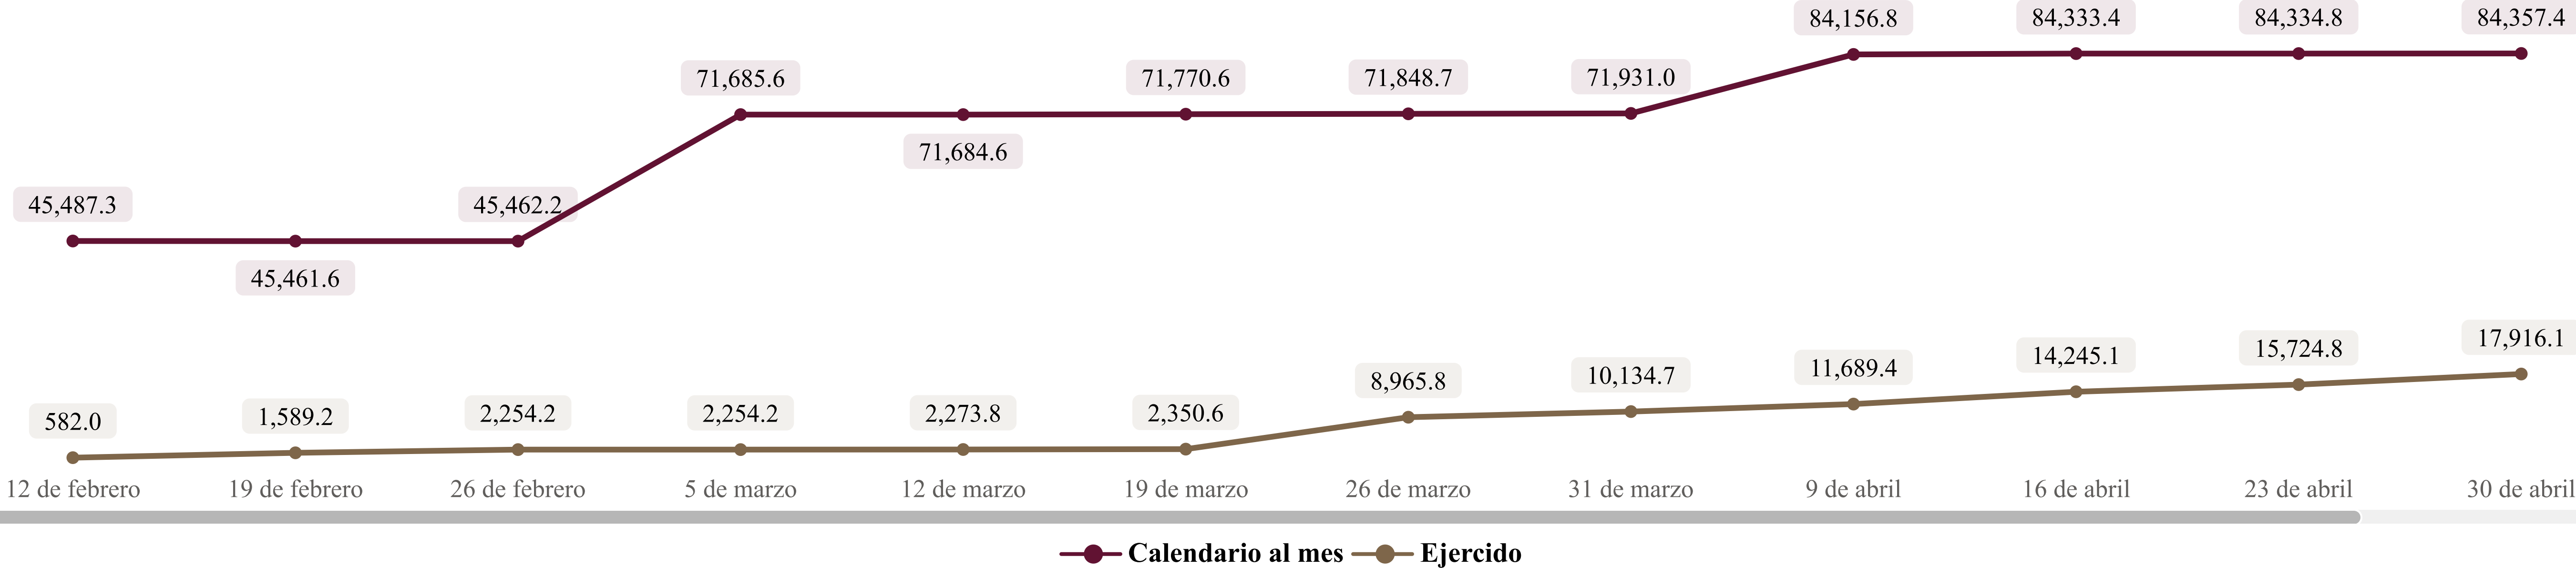

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 164,401.0

Ejercido — 22,922.5

Saldo 141,478.4 86.1 %

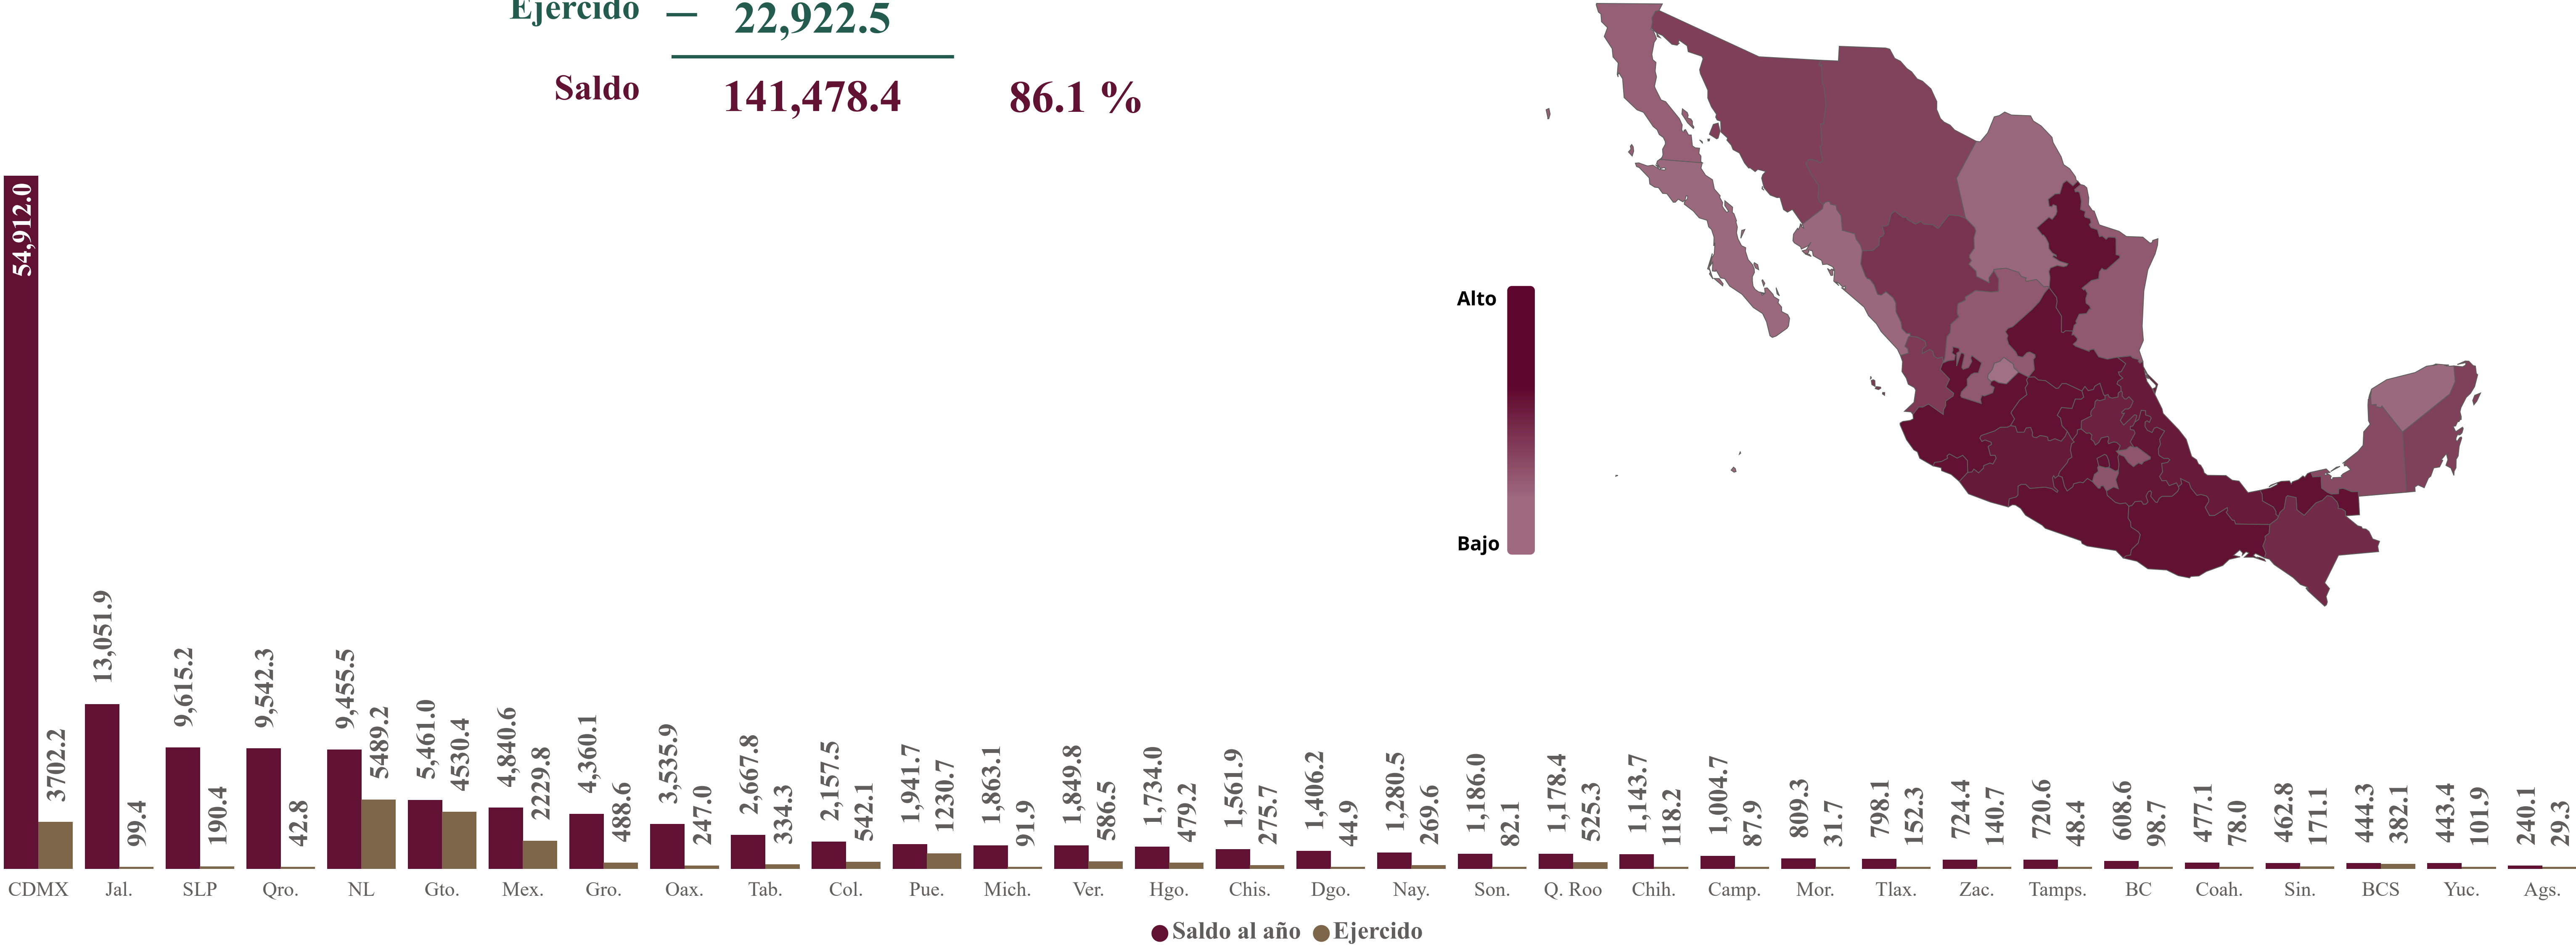



Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
14 de mayo	622	U004	0	Caminos artesanales	59.5
14 de mayo	631	U004	0	Caminos artesanales	194.0
14 de mayo	642	U004	0	Caminos artesanales	43.6
14 de mayo	639	K008	25092170003	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Juárez, Nuevo León	7.0
14 de mayo	626	K016	26096260002	Construcción del PSV Ingreso Principal Manzanillo	366.0
14 de mayo	JZO	K019	2609D000002	Proyecto Integral para la construcción del Corredor con Autobuses de alta capacidad tipo Trolebús en Ixtapaluca, Estado de México.	664.0
7 de mayo	624	K016	25096240001	Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Gustavo Díaz Ordaz-Francisco Escárcega	552.0
7 de mayo	626	K016	26096260003	Construcción del Paso Superior Vehicular del Ferrocarril Recinto Portuario - Tapeixtles (La Flechita)	500.0
30 de abril	642	K008	25092170007	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel El Marqués, Querétaro	0.0
23 de abril	646	K016	23096460001	Camino E.C. (Agua Prieta - Bavispe) - Lim. Edos. Son./Chi. Tramo del Km. 0+000 al Km. 18+093.16	40.0
23 de abril	623	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	622	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
9 de abril	636	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	22.0
9 de abril	645	K016	26092100001	Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2026.	0.5
