

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Infraestructura


Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes

Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

AñoMes


Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
Central	52.526,1	73.583,5	11.610,6	15,8 %	61.972,9		14.726,0	47.246,9
Carreteras Federales	0,0	14.013,3	3.881,5	27,7 %	10.131,8		7.510,5	2.621,4
Caminos Rurales y Alimentadores	0,0	7.460,6	1.976,5	26,5 %	5.484,1		1.436,2	4.047,9
Caminos Artesanales	3.120,9	5.999,5	216,4	3,6 %	5.783,1		345,3	5.437,8
Conservación	27.720,3	23.288,1	4.735,9	20,3 %	18.552,2		5.054,3	13.497,9
PPS's	0,1	682,0	664,8	97,5 %	17,2		0,0	17,2
Servicios Técnicos	1,8	503,9	93,7	18,6 %	410,2		376,6	33,6
Desarrollo Carretero	0,4		0,0				0,0	
Provisiones	21.432,0	21.432,0	0,0		21.432,0		0,0	21.432,0
Infraestructura Educativa y Cultural	0,0	9,7	7,0	71,6 %	2,8		2,7	0,0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250,6	194,4	34,9	18,0 %	159,5		0,4	159,1
Coordinado	92.564,4	91.516,1	14.960,3	16,3 %	76.555,9		242,5	76.313,3
ATTRAPI (ARTF)	45.337,6	45.924,6	14.856,0	32,3 %	31.068,6		230,6	30.837,9
Provisiones para trenes	47.064,0	45.237,3	0,0		45.237,3		0,0	45.237,3
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162,8	354,2	104,2	29,4 %	250,0		11,9	238,1
Total	145.090,5	165.099,6	26.570,9	16,1 %	138.528,8		14.968,6	123.560,2

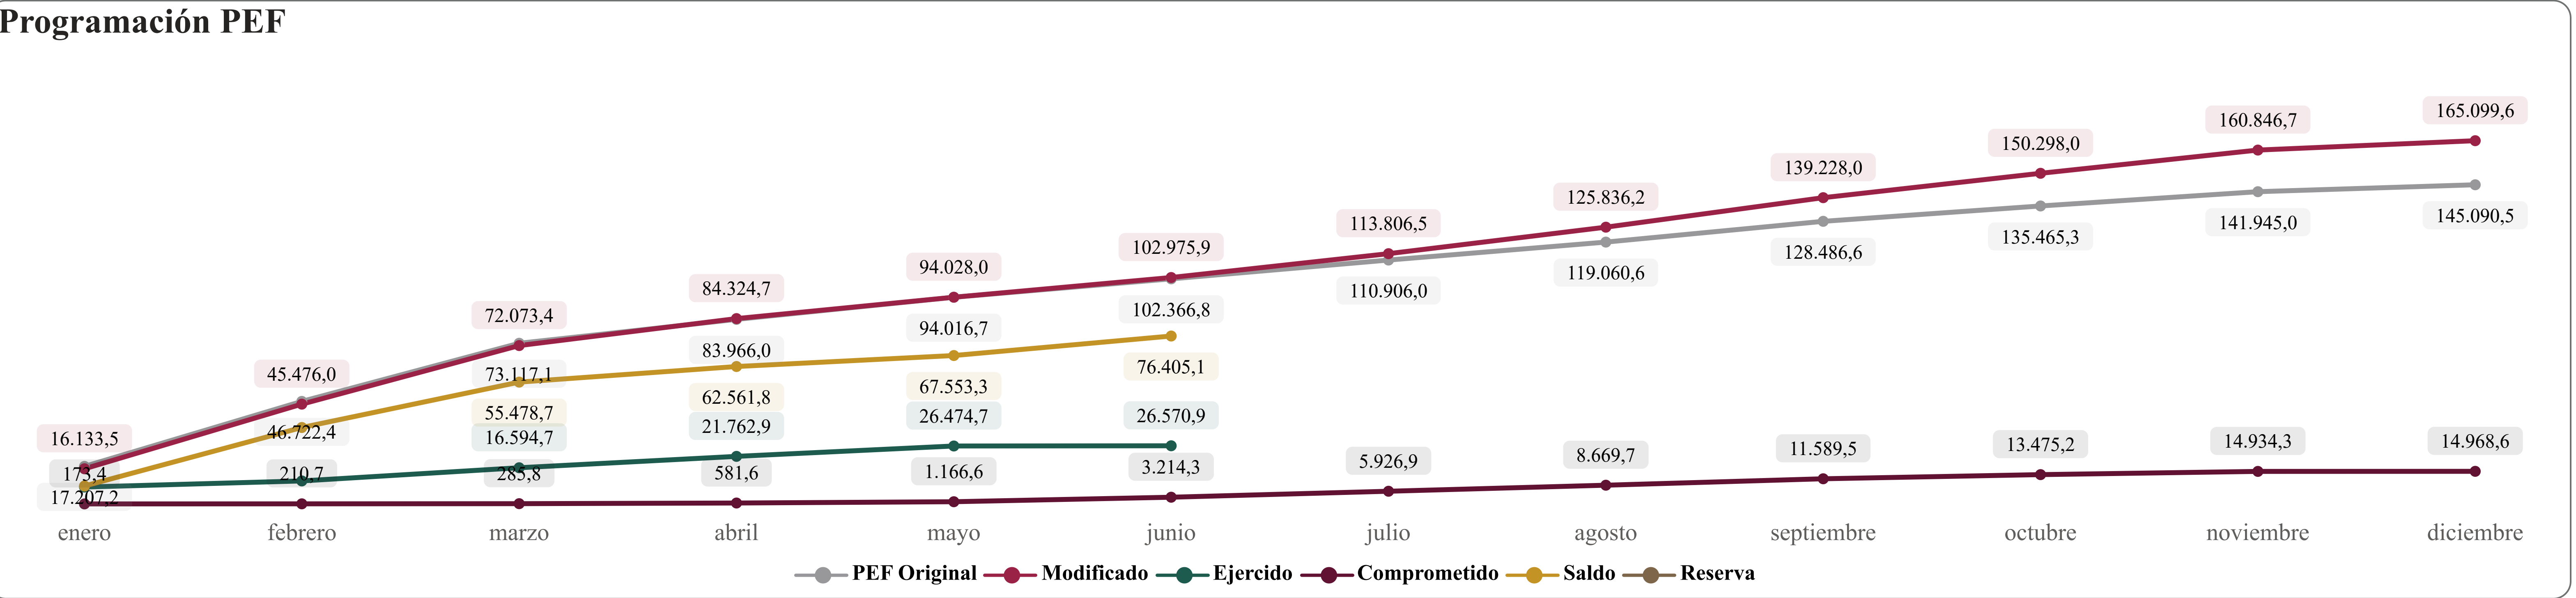




Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 28 de may	Ejercido al cierre del 04 de jun	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Conservación	4.347,06	4.735,9	388,8	18.552,2
Carreteras Federales	3.555,56	3.881,5	325,9	10.131,8
ATTRAPI (ARTF)	14.639,13	14.856,0	216,9	31.068,6
Caminos Rurales y Alimentadores	1.945,09	1.976,5	31,4	5.484,1
Infraestructura Educativa y Cultural	0,00	7,0	7,0	2,8
Servicios Técnicos	86,77	93,7	6,9	410,2
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	98,80	104,2	5,4	250,0
Caminos Artesanales	213,65	216,4	2,7	5.783,1
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	34,58	34,9	0,4	159,5
Desarrollo Carretero	0,00	0,0	0,0	
PPS's	664,81	664,8	0,0	17,2
Provisiones	0,00	0,0	0,0	21.432,0
Provisiones para trenes	0,00	0,0	0,0	45.237,3
Total	25.585,44	26.570,9	985,4	138.528,8

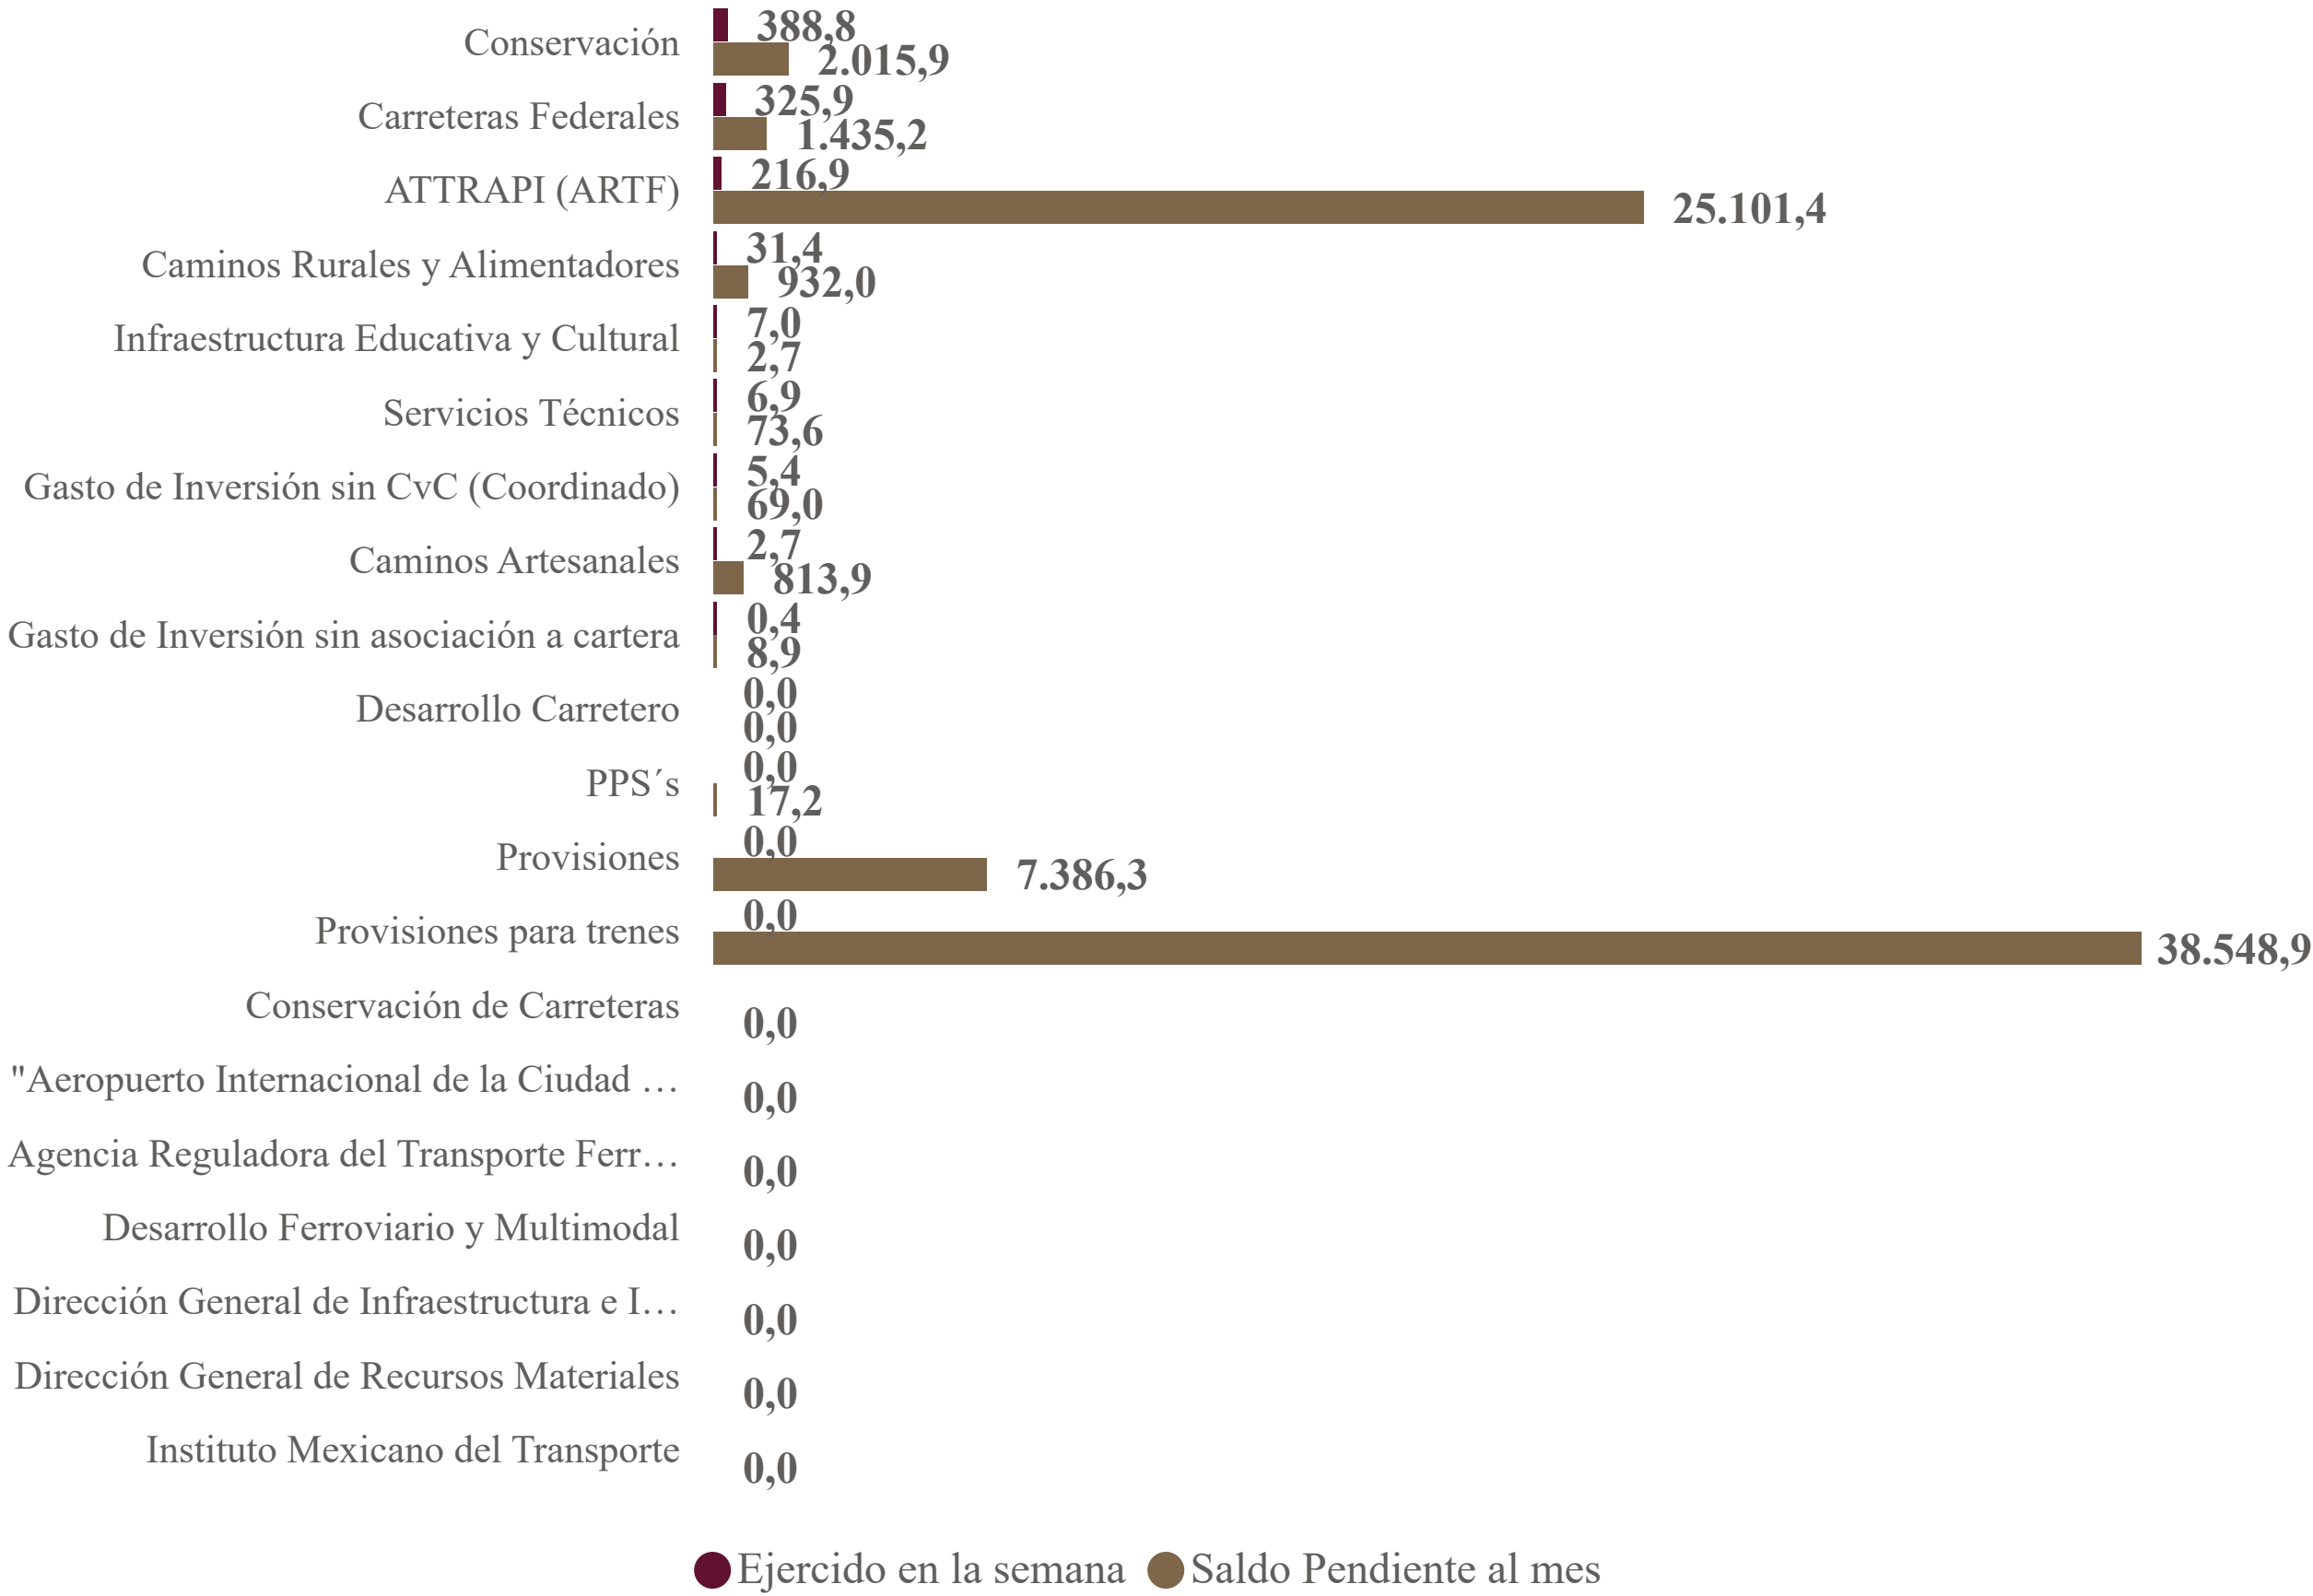

Histórico de ejercido

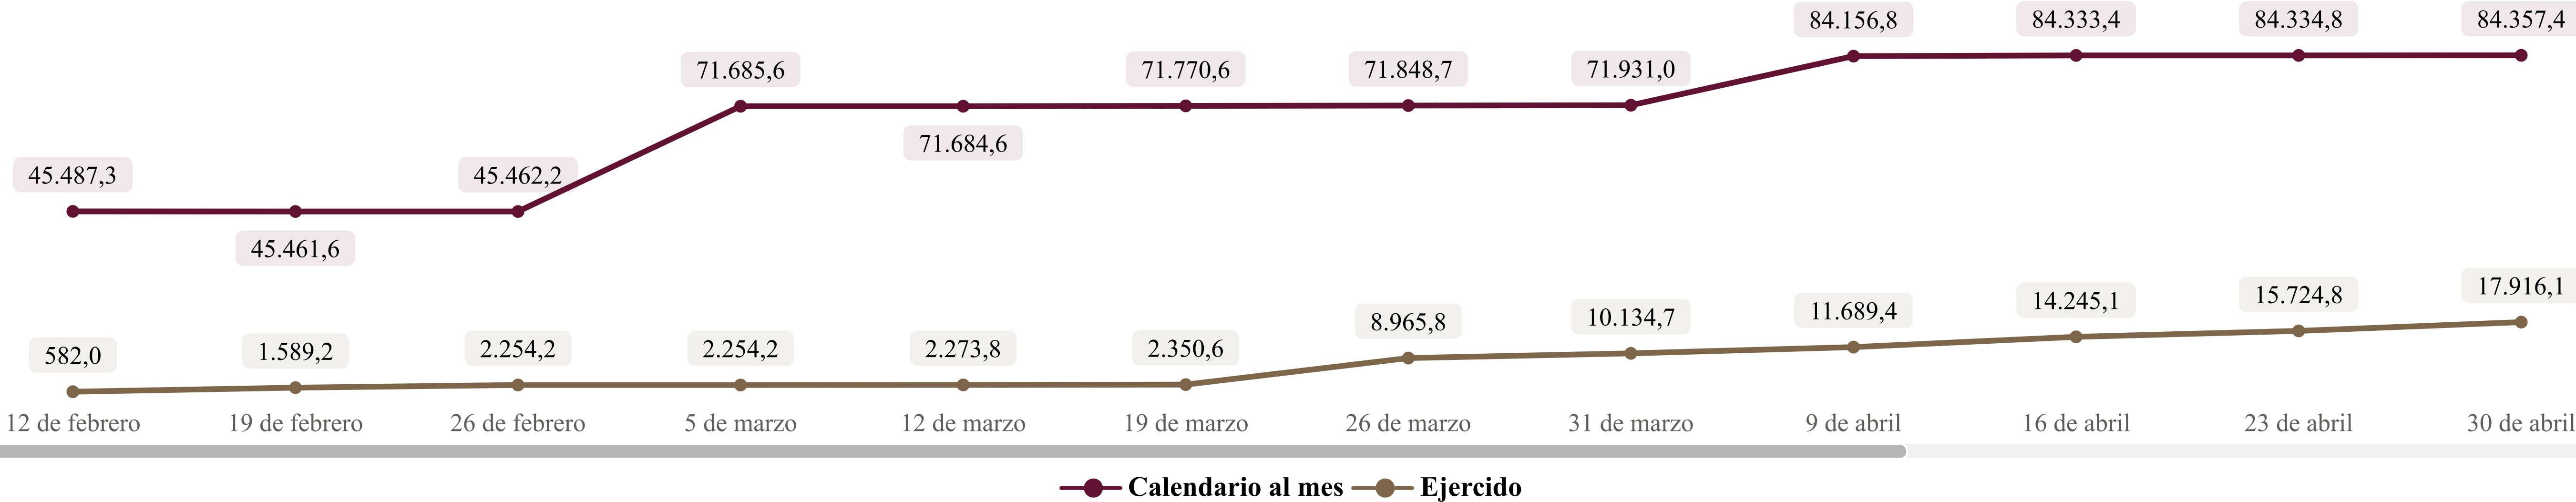

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año





Nacional

Modificado 165.099,6

Ejercido — 26.570,9

Saldo 138.528,8 83,9 %

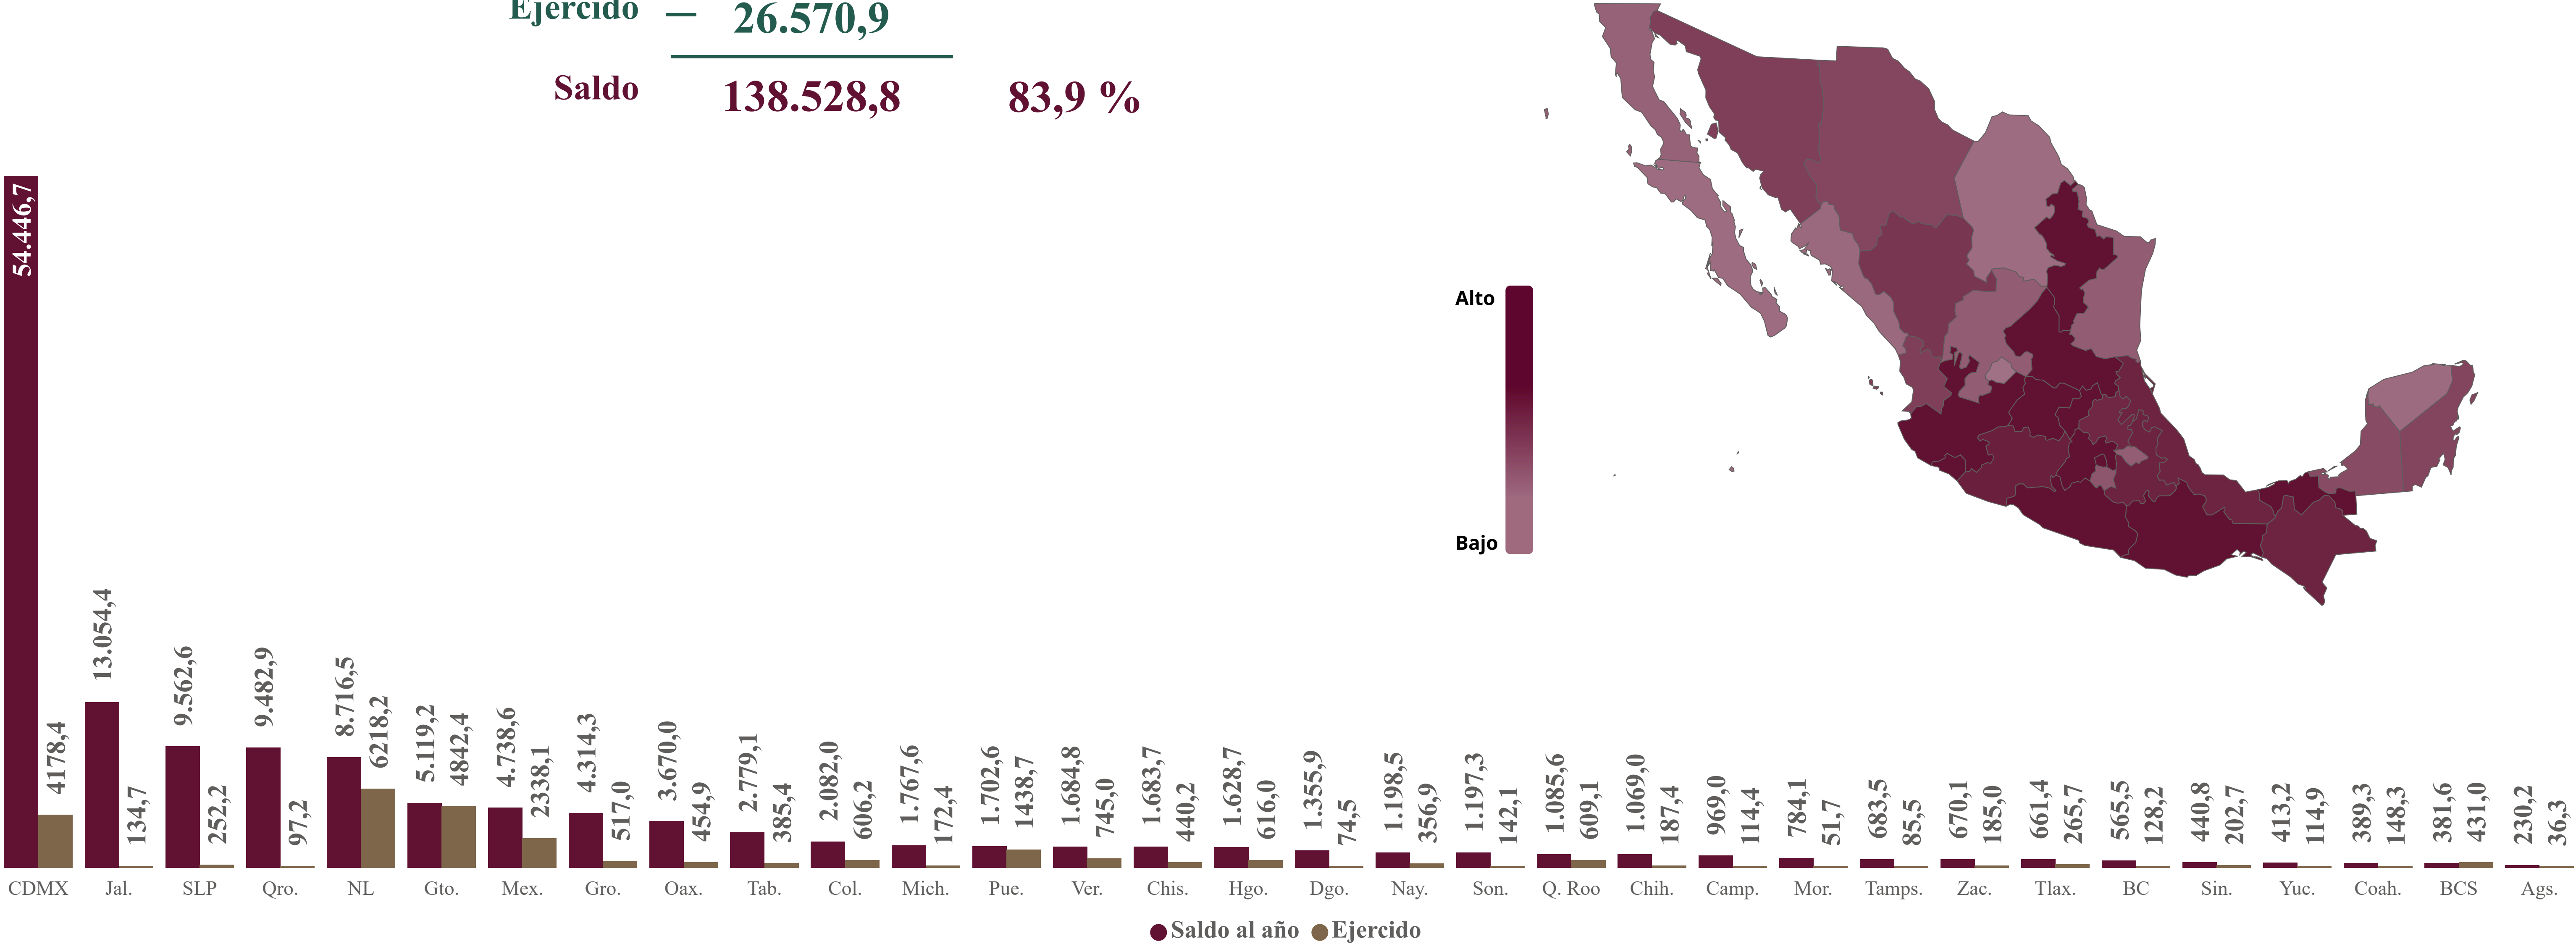



Fecha de Corte ▼	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
4 de junio	JZO	K019	24093110006	Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo	25,5
21 de mayo	632	K016	22096320001	Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.	31,0
21 de mayo	644	K016	17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	16,0
21 de mayo	634	K016	25096340001	Puente Amado Nervo (Federación)	37,8
14 de mayo	622	U004	0	Caminos artesanales	59,5
14 de mayo	631	U004	0	Caminos artesanales	194,0
14 de mayo	642	U004	0	Caminos artesanales	43,6
14 de mayo	639	K008	25092170003	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Juárez, Nuevo León	7,0
14 de mayo	626	K016	26096260002	Construcción del PSV Ingreso Principal Manzanillo	366,0
14 de mayo	JZO	K019	2609D000002	Proyecto Integral para la construcción del Corredor con Autobuses de alta capacidad tipo Trolebús en Ixtapaluca, Estado de México.	664,0
7 de mayo	624	K016	25096240001	Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Gustavo Díaz Ordaz-Francisco Escárcega	552,0
7 de mayo	626	K016	26096260003	Construcción del Paso Superior Vehicular del Ferrocarril Recinto Portuario - Tapeixtles (La Flechita)	500,0
30 de abril	642	K008	25092170007	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel El Marqués, Querétaro	0,0
22 de abril	646	K016	22096460001	Caminos FGR (Aeropuerto, Bimodal, Bimodal, Línea El Estero, San José/Gilbert, 14 Km, 0+000-14+000, 1 Km, 14+000-15+000, 16	40,0
